


DomoFlex 2[®] et IconLift[®]

Plate-formes élévatrice à vis sans fin

CONTÔLES FINAUX (Rev.1.0)

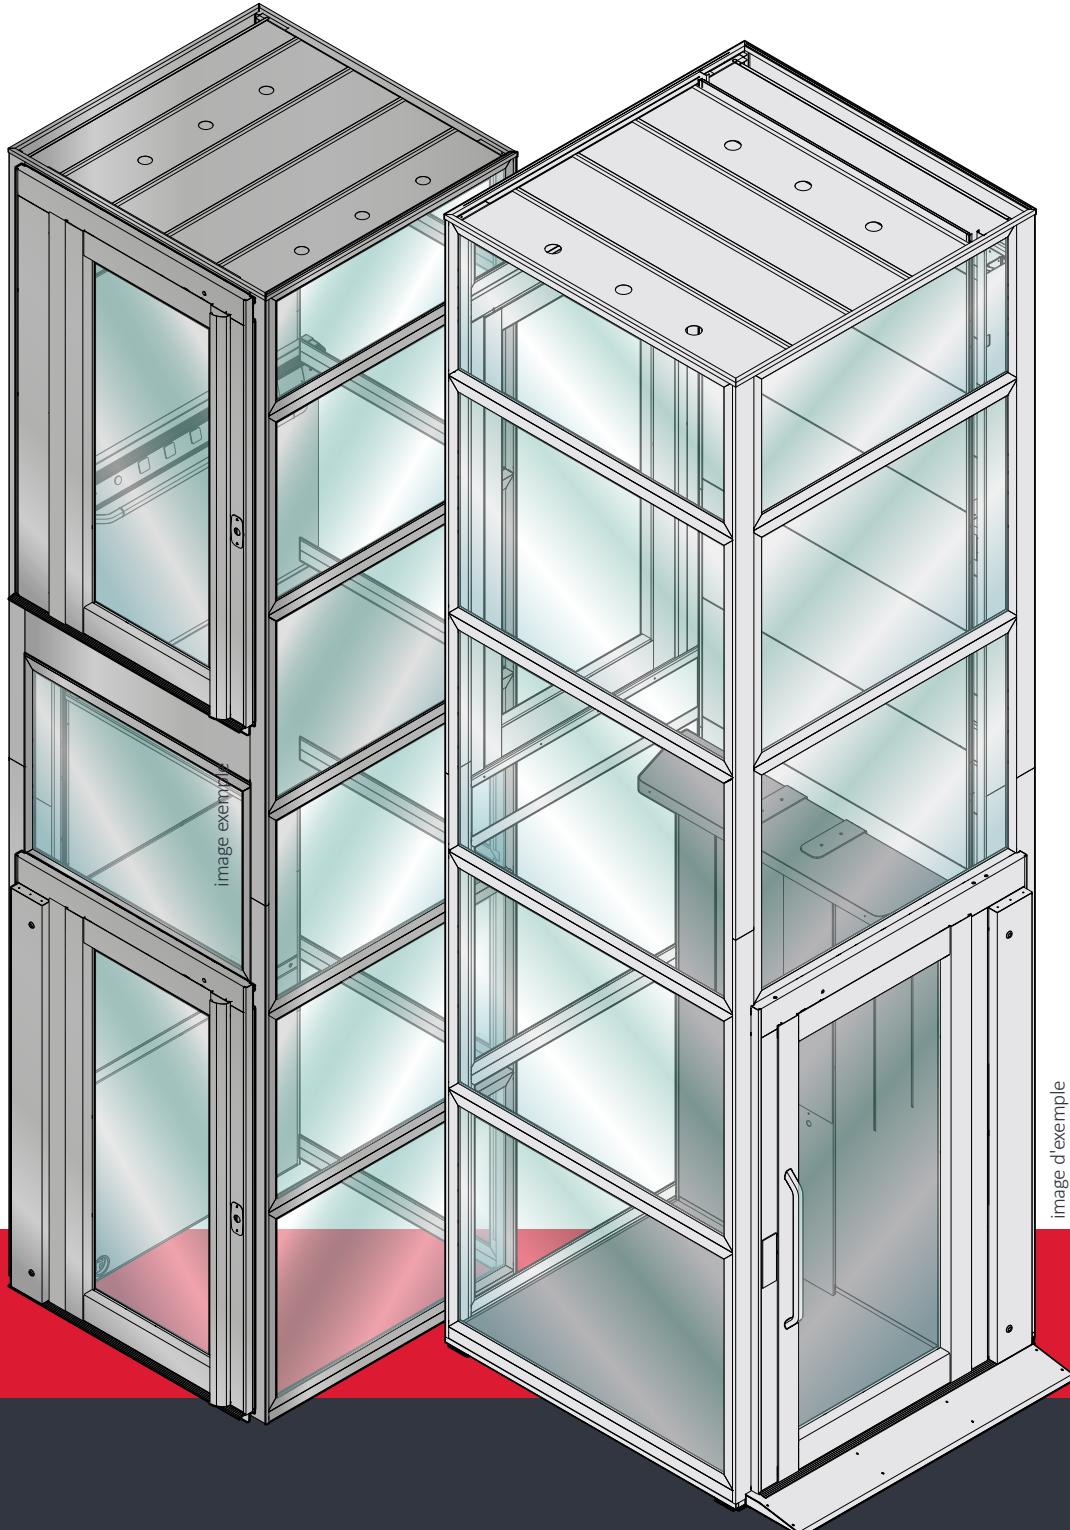

LIFTINGITALIA[®]
AREALIFT[®]

HOMELIFTS & PLATFORM LIFTS MADE IN ITALY

DomoFlex 2[®] e IconLift[®]

CONTRÔLES FINAUX

20230707

0	Première édition	16.01.2022
Rev.	<i>Description</i>	<i>Date</i>

TABLE DES MATIÈRES

1. Guide de la lecture du manuel	5
1.01. Information préliminaires	5
1.02. Sécurité personnelle et identification du risque	6
2. Signalétique d'information et de sécurité	7
2.01. Signalétique de DANGER	7
2.02. Signalétique de d'INTERDICTION	7
2.03. Signalétique d'OBLIGATION	7
2.04. Symboles d'information et infographies	7
3. Responsabilités et conditions de garantie	8
4. Tests et essais de réception et livraison	9
4.01. Vérifications et contrôles pour la documentation de conformité	10
4.01.01 ESSAIS EFFECTUÉS PENDANT LE MONTAGE	11
4.01.02 MATÉRIAUX ORIGINAUX LIFTINGITALIA	11
4.01.03 essai STRUCTURAL	11
4.01.04 Espace de sécurité en cuvette	11
4.01.05 ESSAI DE VITESSE MONTÉE/DESCENTE	11
4.01.06 précision d'arrêt	11
4.01.07 BOUTON « STOP » ET BOUTON D'ALARME	12
4.01.08 ALIMENTATION D'URGENCE	12
4.01.09 MISE EN SÉCURITÉ DE LA GAINÉE	12
4.01.10 COMMANDES	12
4.01.11 CONTACT PANNEAU AMOVIBLE PLATEFORME	12
4.01.12 CONTACT D'EXTRACOURSE ET ZONES DE SÉCURITÉ DANS LA HAUTEUR LIBRE	12
4.01.13 SERRURES DES PORTES PALIÈRES	13
4.01.14 DISTANCES DE L'ENTRÉE	13
4.01.15 DISTANCE ENTRE LES étriers de fixation DES GUIDES	13
4.01.16 raccordement à la terre	13
4.01.17 Isolation électrique	13
4.01.18 ÉCLAIRAGE DE LA GAINÉE ET PRISE DE COURANT (S'IL Y EN A)	14
4.01.19 BORDURES SENSIBLES DE SECURITE	14
4.01.20 clés d'habilitation DES BOUTONS (en option)	14
4.01.21 TABLEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE	14
4.01.22 SIGNALISATION	14
5. Confirmation du contrôle final et mise en service	16

DomoFlex 2[®] e IconLift[®]

CONTRÔLES FINAUX

PAGE BLANCHE

1. Guide de la lecture du manuel

IMPORTANT !



FR: Traduction des instructions originales

Ce produit ne doit être mis en service que lorsque vous disposez des présentes instructions dans une langue officielle de l'UE que vous comprenez et que vous avez compris son contenu. Si cela n'est pas le cas, veuillez vous adresser à votre interlocuteur Lifting Italia S.r.l.

LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL

AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION ET À L'UTILISATION DE L'APPAREIL

Conserver la documentation technique à proximité de la plateforme élévatrice pendant toute la durée de vie du produit. En cas de changement de propriétaires, la documentation technique doit être fournie au nouvel utilisateur en tant que partie intégrante du produit.

1.01. Information préliminaires

AVIS



La plateforme doit être installée et mise en marche, selon les dispositions en vigueur. Une installation non conforme, ou une utilisation incorrecte, peuvent non seulement causer des graves dommages aux personnes/chooses, mais aussi provoquer la cessation de la garantie.

SUIVRE LES SUGGESTIONS ET LES RECOMMANDATIONS POUR TRAVAILLER EN SÉCURITÉ. Une modification non autorisée quelconque, peut compromettre tant la sécurité que le bon fonctionnement et la durée de vie de la plateforme. Pour plus d'explications relativement aux informations contenues dans ce manuel, veuillez contacter LIFTING ITALIA S.r.l.

PERSONNEL SPÉCIALISÉ: L'installation de l'appareil, doit être effectuée exclusivement par du personnel spécialisé, dans le respect de la documentation technique annexe (tout particulièrement des avertissements de sécurité et des précautions y détaillées).



Les spécifications techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis à cause de l'optimisation des produits.

Les dessins contenus dans ce manuel doivent être considérés comme indicatifs et NE représentent PAS une description exacte du produit.

1.02. Sécurité personnelle et identification du risque

Le manuel synthétise les normes de sécurité à observer pour préserver l'intégrité personnelle et éviter les dommages matériels.

Les indications à respecter pour assurer la sécurité personnelle sont marquées par un symbole en forme de triangle, alors que celles visant à éviter les dommages matériels n'ont aucun symbole. Les avis de danger représentés ci-dessous, indiquent, en ordre décroissant, les différents niveaux de risque.

CLASSIFICATION DES RISQUES ET GRAVITÉ RELATIVE DES DOMMAGES	
DANGER	Le symbole indique que le non-respect des consignes de sécurité nécessaires <u>provoque</u> la mort ou des lésions physiques graves.
AVERTISSEMENT	Le symbole indique que le non-respect des consignes de sécurité nécessaires <u>peut provoquer</u> la mort ou des lésions physiques graves.
ATTENTION	Le symbole indique que le non-respect des consignes de sécurité nécessaires <u>peut causer</u> des lésions physiques modérées ou des dommages à l'appareil.
AVIS	Ce n'est pas un symbole de sécurité. Il indique que le non-respect des consignes de sécurité nécessaires <u>peut causer</u> des dommages matériels.
INFORMATION	Ce n'est pas un symbole de sécurité. Il signale des informations importantes.

NIVEAU DE RISQUE

Dans l'éventualité où plusieurs niveaux de risque convergent, l'avis signale toujours le danger le plus élevé. En outre, un avis peut à la fois signaler, tant un risque de lésions corporelles, qu'un risque de possibles endommagement des matériaux.

AVERTISSEMENT	
	En phase de montage/entretien, les fonctions de sécurité de la plateforme seront temporairement suspendues. Il faudra donc adopter tout type de précaution, de manière à éviter : lésions corporelles et/ou dommages à l'appareil.

2. Signalétique d'information et de sécurité

2.01. Signalétique de DANGER

	DANGER GÉNÉRAL		DANGER ÉLECTRIQUE		DANGER MATIÈRES INFLAMMABLES
	DANGER DE CHUTE DE DÉNIVELLATION		DANGER CHARGES SUSPENDUES		DANGER ECRASEMENT

2.02. Signalétique de d'INTERDICTION

	INTERDICTION GÉNÉRALE		INTERDIT DE MARCHER SUR LA SURFACE		INTERDICTION DE MARCHER OU STATIONNER À CET ENDROIT
---	-----------------------	---	------------------------------------	---	---

2.03. Signalétique d'OBLIGATION

	CASQUE DE PROTECTION OBLIGATOIRE		CHAUSSURES DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRES		GANTS DE PROTECTION OBLIGATOIRES
	LUNETTES DE PROTECTION OBLIGATOIRES		SERRE-TÊTE ANTIBRUIT OBLIGATOIRE		

2.04. Symboles d'information et infographies

	MARQUER		PERCER ET/OU VISSEZ		COUPER ET/OU RECTIFIER
	MESURER		APPLIQUER DES RIVES		UTILISER DES VENTOUSES
	UTILISER LE MARTEAU		METTRE À NIVEAU		UTILISER UN HOCHET

	INFORMATION Symbole qui identifie une information utile à l'installateur mais qui ne limite pas le montage, ni ne détermine un risque pour l'opérateur.
	IMPORTANT ! Symbole qui identifie les informations importantes à respecter scrupuleusement.
	BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES Symbole qui identifie le branchement d'un composant électrique.

3. Responsabilités et conditions de garantie

RESPONSABILITÉS DE L'INSTALLATEUR

IMPORTANT !



Les installateurs ont la responsabilité de faire respecter les procédures de sécurité du travail, ainsi que les règlements de sécurité et de protection de la santé en vigueur dans le pays, et sur le site, d'installation de l'appareil.

Les personnes agréées pour l'installation, la maintenance et le secours sont en possession du certificat d'habilitation à la maintenance d'ascenseurs, délivré conformément aux normes en vigueur dans le pays d'installation.

L'élévateur / plate-forme (et chacun de ses composants) doit être installé comme décrit dans le dessin de projet joint au système et en suivant les instructions de ce manuel ; toute sorte de divergence par rapport à la procédure standard, peut graver négativement sur le fonctionnement et la sécurité de l'appareil, causant de plus l'immédiate déchéance de la garantie.

Toute modification ou variation apportée au plan et à la notice de montage, devra être soigneusement documentée et promptement référée à LIFTING ITALIA S.r.l., de manière à lui permettre une adéquate évaluation de la solution convenue. Un appareil modifié, ne pourra en aucun cas être mis en service, sans l'autorisation expresse de LIFTING ITALIA S.r.l.

L'appareil doit être uniquement employé selon les modalités prévues et illustrées par les manuels (transport de personnes et/ou choses, charge maximum, cycle d'utilisation etc.). LIFTING ITALIA S.r.l. ne peut prendre aucune responsabilité quant aux dommages aux personnes et/ou aux biens dérivants d'une utilisation non-conforme de l'appareil.



Les photos et les images de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement.

4. Tests et essais de réception et livraison



Le manuel « contrôles finaux » contient un compte rendu des vérifications avant la mise en service de l'ascenseur qui doit être effectuée par l'installateur qui, après avoir terminé le travail, apposera la date et sa signature, en indiquant clairement les coordonnées de l'entreprise d'installation et toutes les autres annotations.

Le manuel sera signé aussi par le propriétaire à titre de confirmation pour le test de démarrage effectué, livraison effectuée et consigne du manuel avec les instructions d'usage. Remplir ce manuel en suivant les instructions contenues dans les sections suivantes: il faut le garder avec l'ascenseur et il constitue une documentation de conformité à la norme; le formulaire dans la dernière page doit être envoyé, avant 15 jours à partir de la date indiquée sur le formulaire à la maison productrice pour garantir le début de la période de garantie contractuelle. Si le formulaire n'a pas été présenté conformément aux instructions ci-dessus, la période de garantie ne s'étendra pas au-delà de la période de garantie de la date d'envoi de l'ascenseur par le fabricant

4.01. Vérifications et contrôles pour la documentation de conformité

Les tests individuels décrits ci-dessous sont utilisés pour vérifier la bonne exécution du montage : pour chacun d'eux ci-dessous il est indiqué la qualité requise et le type de vérification à effectuer.

AVIS	
	PERSONNEL QUALIFIÉ Les opérations décrites dans ce chapitre ne peuvent être effectuées que par du personnel qualifié.

Le dessin de projet et le schéma de câblage aident à effectuer une bonne vérification.

Si l'une des vérifications conduit à un résultat négatif, il sera nécessaire de corriger l'installation et de la répéter correctement en suivant les instructions d'assemblage.

AVERTISSEMENT	
	DANGER ECRASEMENT Avant l'entrée dans la cuvette, ouvrir l'interrupteur général dans l'armoire de manœuvre et activer le dispositif de sécurité.
AVERTISSEMENT	
	DANGER ELECTRICITÉ Certaines opérations doivent être effectuées à l'armoire ouvert et sous tension.

Effectuer les tests à cabine vide, sauf dans les cas où il est indiqué de charger la cabine.

AVIS	
	NOTE 1: Quand il est indiqué dans les instructions d'effectuer des essais « avec une charge statique maximale » il se rend nécessaire de charger la cabine, de façon uniforme. NOTE 2: Si dans les instructions il est indiqué d'effectuer des essais « à pleine charge », il faut charger la cabine, de façon uniforme, avec une masse équivalente à la capacité nominale (indiquée sur la plaque signalétique de la cabine). NOTE 3: Si dans les instructions il est indiqué de « réinitialiser l'ascenseur », il faudra suivre à l'invers les instructions ci-décrisées pour ramener l'ascenseur à ses conditions de départ.

4.01.01 ESSAIS EFFECTUÉS PENDANT LE MONTAGE

Vérifier la bonne réussite des essais menés aux points du manuel de montage:

- § 8.01. Système Électrique En Amont De La Plateforme - Préparation
- § 10.0.9. Raccordements électriques pour le premier démarrage
- § 10.10. Avant d'actionner la plateforme
- § 11. Première course d'essai

4.01.02 MATÉRIAUX ORIGINAUX LIFTINGITALIA

La plate-forme doit correspondre au projet mis en place par LIFTINGITALIA. Pour cela faire l'installateur doit confirmer avoir utilisé, comme selon le projet, seulement des matériaux fournis par LIFTINGITALIA.

PLATE-FORME CHARGÉE AU MAXIMUM

4.01.03 ESSAI STRUCTURAL

Après avoir chargé la cabine avec le maximum de la charge vérifier qu'il n'y ait pas des déformations structurelles.

PLATE-FORME À PLEINE CHARGE

4.01.04 ESPACE DE SÉCURITÉ EN CUVETTE

Vérifier l'espace de sécurité en cuvette et la résistance mécanique du dispositif safe-pit avec la cabine à pleine charge:

- I. envoyer la cabine à un étage supérieur;
- II. ouvrir la porte à l'étage le plus bas et activer le dispositif safe-pit;
- III. fermer la porte et envoyer la cabine à l'étage inférieur;
- IV. ouvrir la porte à l'étage le plus bas et sans entrer dans la cuvette vérifier que la cabine soit correctement appuyée, **avec une hauteur libre de minimum 500 mm**;
- V. ramener la cabine à un étage supérieur et vérifier que l'étai et sa fixation n'ont pas été endommagés;
- VI. réinitialiser l'ascenseur.

4.01.05 ESSAI DE VITESSE MONTÉE/DESCENTE

Vérifier la vitesse de montée et de descente de la cabine à pleine charge:

- I. mesurer la distance entre les étages (mètres);
- II. faire monter la cabine d'un étage à l'autre et mesurer le temps employé (secondes);
- III. répéter la descente;
- IV. claculer la vitesse en divisant la distance (en mètres) par le temps (en secondes);
- V. la vitesse doit être inférieure à 0,15 mètres / seconde;**
- VI. réinitialiser l'ascenseur.

CABINE VIDE ET À PLEINE CHARGE

4.01.06 PRÉCISION D'ARRÊT

Vérifier la précision d'arrêt (avec la cabine vide aussi bien qu'à pleine charge):

- I. commander toujours par la boîtes à boutons palière;
- II. avec la cabine chargée, exécuter une course en montée en s'assurant qu'elle s'arrête par elle-même à l'étage;
- III. ouvrir la porte palière et sans entrer dans la cabine, mesurer la distance verticale entre le seuil de cabine et le sol d'étage;
- IV. répéter l'opération en montée pour les autres arrêts;;
- V. répéter l'opération en descente pour les autres arrêts;
- VI. répéter l'opération en montée et en descente avec la cabine vide;
- VII. différence maximale admise pour tous les cas : 10 mm sur ou sous l'étage.**

CABINE VIDE**4.01.07 BOUTON « STOP » ET BOUTON D'ALARME**

Vérifier que le bouton STOP arrête l'ascenseur et que le bouton d'alarme active la signalisation acoustique:

- I. arrêter la cabine entre deux étages en appuyant sur le bouton STOP;
- II. commander la montée et la descente de la boîte à boutons en cabine : **l'ascenseur ne doit pas se déplacer;**
- III. répéter l'opération de la boîte à boutons palière : **le signal d'occupé est allumé et l'ascenseur ne doit pas se déplacer;**
- IV. appuyer sur le bouton d'alarme : **la sirène doit sonner;**
- V. réinitialiser l'ascenseur.

4.01.08 ALIMENTATION D'URGENCE

Vérifier l'efficacité de la puissance d'urgence:

- I. envoyer la cabine à un étage supérieur;
- II. couper l'alimentation en ouvrant l'interrupteur général de l'ascenseur, et non le général de « FM », pour simuler un black-out électrique;
- III. **l'éclairage de secours dans la cabine s'allume;**
- IV. appuyer sur le bouton d'alarme: **la sirène doit sonner;**
- V. appuyer et maintenir appuyé sur n'importe quel bouton de manœuvre, **la plate-forme descend et s'arrête au niveau de l'étage le plus bas. à ce point il est possible ouvrir la porte;**

VI. réinitialiser l'ascenseur.

4.01.09 MISE EN SÉCURITÉ DE LA GAINÉE

La gaine doit être complètement fermée.

4.01.10 COMMANDES

Vérifier l'exactitude des commandes:

- I. avec une personne dans la plate-forme essayer de faire monter et descendre l'ascenseur à tous les étages en s'assurant que l'arrêt automatique fonctionne correctement;
- II. relâcher le bouton de cabine à l'avance, après cela l'ascenseur doit s'arrêter immédiatement;
- III. essayer d'appeler la cabine depuis tous les étages en vérifiant que l'arrêt automatique et le fonctionnement des signalisations d'occupé/présent fonctionnent correctement.

4.01.11 CONTACT PANNEAU AMOVIBLE PLATEFORME

Vérifier que l'ouverture du panneau amovible de plateforme provoque l'interruption de la série des sécurités (activation des systèmes de sécurité) :

- I. ouvrir le panneau amovible de plateforme;
- II. appuyer sur un des boutons d'appel : **la plate-forme ne doit pas se déplacer.**
- III. réinitialiser l'ascenseur.

4.01.12 CONTACT D'EXTRACOURSE ET ZONES DE SÉCURITÉ DANS LA HAUTEUR LIBRE

Vérifier le bon fonctionnement du contact d'extracourse et de l'espace de sécurité dans la hauteur libre:

- I. envoyer la cabine à l'étage le plus haut;
- II. à partir du tableau de manœuvre électrique, commander à l'aide du bouton UP la montée de la plate-forme jusqu'au **déclenchement du contact d'extracourse** (le contact se déclenche quand l'ascenseur ne répond pas à un appel depuis l'extérieur);

- III. depuis la plateforme, mesurer la distance entre la surface extérieure de l'arcade et la surface la plus basse de la poutre support vis : elle ne doit pas être < 100 mm ;
- IV. ramener la plateforme au palier en utilisant la descente de secours (bouton SB-MEM) et rétablir le fonctionnement normal.
- V. répéter l'opération du contact d'extracourse avec la plate-forme à l'étage le plus bas.

4.01.13 SERRURES DES PORTES PALIÈRES

Inspecter la serrure des portes palières.

- a) la serrure doit bloquer la porte palière; cette condition est vérifiée automatiquement avec les conditions suivantes b) et c).
- b) **la serrure devrait permettre une zone de déverrouillage au maximum de 50mm, au-dessus et au-dessous de chaque étage;** voilà les opérations à effectuer pour cette vérification:
 - I. mesurer la différence entre le seuil d'étage et la plate-forme; distance maximale 50 mm;
 - II. Répéter l'opération pour tous les arrêts, au-dessus aussi bien qu'au dessous de l'étage;
 - c) en dehors de la zone de déverrouillage l'ascenseur fonctionne seulement avec les portes fermées et verrouillées. Le mouvement est contrôlé par le contact à pont amovible de la serrure et le contact préliminaire de rapprochement du battant. Pour vérifier l'indépendance et l'efficacité des tous les contacts:
 - I. se rendre au palier le plus bas et ouvrir la porte;
 - II. faire court-circuiter le contact de la serrure;
 - III. faire monter la plate-forme: l'installation ne doit pas se déplacer;
 - IV. enlever le court-circuit de la serrure et le faire sur celui préliminaire en s'assurant que le contact de la serrure reste ouvert;
 - V. commander la montée de la plate-forme: l'ascenseur part et puis s'arrête;
 - VI. enlever le court-circuit et mesurer le dénivellation entre le seuil de l'étage et de plate-forme; distance maximale 50 mm;
- VII. Répéter l'opération pour tous les arrêts en montée comme en descente.

4.01.14 DISTANCES DE L'ENTRÉE

Vérifiez la distance maximale entre la gaine et les entrées de la plate-forme:

- I. mesurer la distance entre la plate-forme de chargement, les portes et la paroi de la gaine du côté de l'entrée: la distance entre la gaine et la plate-forme de chargement ne devra pas dépasser 20 mm sur toute la longueur de la course.

4.01.15 DISTANCE ENTRE LES ÉTRIERS DE FIXATION DES GUIDES

Vérifier que la distance verticale entre chaque étrier de fixation des guides et l'étrier suivant ne soit pas majeur de la proportion indiquée sur le dessin de projet.

4.01.16 RACCORDEMENT À LA TERRE

Vérifier la continuité électrique:

- I. avec l'ascenseur en marche, produire un court-circuit entre le dernier point des sécurités et le raccordement à terre;
- II. vérifier l'arrêt de la plate-forme et que le dispositif de protection est intervenu (alimentateur switching);
- III. éliminer le court-circuit. Vérifier que l'appareil ne se réinitialise qu'après avoir effectué la réinitialisation depuis le tableau de commande.

4.01.17 ISOLATION ÉLECTRIQUE

Vérifier l'isolation à la terre en suivant les instructions spécifiques figurant sur le manuel de l'équipement électrique.

DomoFlex 2® e IconLift®

CONTRÔLES FINAUX

4.01.18 ÉCLAIRAGE DE LA GAINÉE ET PRISE DE COURANT (S'IL Y EN A)

Vérifier l'allumage et l'extinction de la lumière fixe dans la gaine (si présente) durant le fonctionnement de la machine ;

4.01.19 BORDURES SENSIBLES DE SECURITE

Vérifier le bon fonctionnement de:

Avec la plate-forme en mouvement, appuyer les bords sensibles vers le bas; l'ascenseur doit s'arrêter et rester arrêté jusqu'à ce que l'obstacle soit éliminé. Après cela il sera possible faire remonter l'ascenseur.

4.01.20 CLÉS D'HABILITATION DES BOUTONS (EN OPTION)

Pour vérifier leur fonctionnement :

- I. sans agir sur la clé d'habilitation, essayer de commander la montée et la descente dans la plate-forme, : l'ascenseur ne doit pas se déplacer;
- II. appuyer sur le bouton d'alarme : la sirène doit sonner ;
- III. répéter l'opération après avoir commuté la clé : l'ascenseur doit se déplacer normalement ;
- IV. répéter l'opération à chaque étage en agissant sur la clé de l'étage.

4.01.21 TABLEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

Vérifier que:

- I. le local pour l'armoire de commande est protégé contre les intempéries et l'humidité. Dans le local maintenir toujours une température comprise entre 5 et 40 ° C ;
- II. l'espace devant l'ouverture de l'armoire soit libre et qu'il ait une largeur et une hauteur suffisante pour une bonne accessibilité du tableau;
- III. il y ait un éclairage suffisant pour avoir une bonne visibilité des composants dans l'armoire ;
- IV. les câbles électriques branchés à l'armoire soient protégés contre d'éventuels dégâts et qu'ils soient inspectables.

4.01.22 SIGNALISATION

Vérifier la correcte application des plaques et des panneaux suivants:

- I. dans la cuvette, pour indiquer le danger d'accès et exiger l'activation du dispositif de sécurité;
- II. sur le tableau électrique qui indique le danger électrique et les instructions pour la manœuvre d'urgence manuelle;
- III. à côté de l'interrupteur d'alimentation pour indiquer les modalités d'intervention;
- IV. dans la plate-forme, pour indiquer la charge utile, la capacité, le nom du fabricant et les instructions pour la manœuvre d'urgence de la boîtes à boutons (en cas de panne de courant);
- V. près de l'alarme externe de l'ascenseur pour en indiquer la fonction.

4.01.23 RÉFÉRENCES D'USURE DE LA VIS-ÉCROU

Vérifier que :

- I. la position du registre d'usure de la vis d'assemblage est conforme à celle décrite dans le manuel d'installation (§ 12.06. Vis d'assemblage - contrôle d'usure) : le bord supérieur du registre doit être aligné à +/- 0,1 mm avec la face supérieure de la vis de sécurité avant la mise en service ;
- II. la position du contact d'usure de la vis-mère est conforme à celle décrite dans le manuel d'installation (§ 12.06. Vis-mère - contrôle de l'usure) : la tête du contact doit être à ~1mm de la surface verticale et de la surface inclinée de la vis-mère avant la mise en service..

Liste des composants de sécurité mis en place :

Composants de sécurité	Type de composant
Serrure des portes palières	

ASCENSEUR N° _____	ANNÉE DE CONSTRUCTION : _____	
CHARGE UTILE : _____ kg	COURSE : _____ m	
N° DES ARRETS: _____	N° SERVICES : _____	N° DES ACCÈS DE PLATE-FORME : _____
Entreprise productrice : LIFTINGITALIA S.r.l. Adresse : rue Caduti del Lavoro, 16 - 43058 Bogolese di Sorbolo (PR) - ITALIE tél. +39 0521.695311 - fax. +39 0521.695313	Entreprise fournitrice : LIFTINGITALIA S.r.l. Adresse: Rue Caduti del Lavoro, 16 - 43058 Bogolese di Sorbolo (PR) - ITALY tél. +39 0521.695311 - fax. +39 0521.695313	
Propriétaire : _____ Adresse : _____	Lieu d'installation: _____ Adresse : _____	
Tél. _____ - Fax. _____	Tél. _____ - Fax. _____	
Entreprise d'installation : _____ Adresse : _____	Contrôles effectués le : _____ par M. _____ en tant que représentant de l'installateur	
Notes: _____ _____		

5. Confirmation du contrôle final et mise en service

Confirmation du contrôle final et mise en service pour la plate-forme N° _____

Toutes les vérifications ont réussi

OUI

NON

Notes:

Date _____

Signature de l'installateur/Vérificateur: _____

Vu que tous les contrôles ont été réalisés, l'installateur certifie d'avoir effectué son travail à la règle de l'art.

Le fabricant établit la déclaration CE de conformité et à ce point l'installateur peut apposer le marquage CE dans la plate-forme.

La plate-forme peut être mis en service lorsqu'il répond aux caractéristiques requises par les normes de référence.

COPIE à ENVOYER AU FOURNISSEUR

Confirmation du contrôle final et mise en service pour la plate-forme N° _____

Toutes les vérifications ont réussi

OUI

NON

Notes:

Date _____

Signature de l'installateur/Vérificateur: _____

Vu que tous les contrôles ont été réalisés, l'installateur certifie d'avoir effectué son travail à la règle de l'art.

Le fabricant établit la déclaration CE de conformité et à ce point l'installateur peut apposer le marquage CE dans la plate-forme.

La plate-forme peut être mis en service lorsqu'il répond aux caractéristiques requises par les normes de référence.



HOMELIFTS & PLATFORM LIFTS MADE IN ITALY



LIFTING ITALIA S.r.l.

Via Caduti del Lavoro, 16
43058 Bogolese di Sorbolo - Parma, Italy
Tel. +39 0521 695311

www.liftingitalia.com



AREALIFT S.r.l.

Via Caduti del Lavoro, 22
43058 Bogolese di Sorbolo - Parma, Italy
Tel. +39 0521 695311

www.arealift.com

info@arealift.com



TECHNICAL SUPPORT

Tel. +39 0521 695328
support@liftingitalia.com
